

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Yucatán**

Entidad federativa: Yucatán

Clave Inst 911: 31MSU0096J

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional
Teléfono: 999 9300900 ext. 1308
Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar, M.I.
Cargo: Director General de Finanzas y Administración
Teléfono: 999 9300130 ext. 80211 y 80212
Correo electrónico: escoffie@correo.uady.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Implementación de sistema fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería Química					X	\$ 13,269,604.00	\$ -	\$ 13,269,604.00	Módulos fotovoltaicos PERC MONO de 545 w	600	3,720,000.00			0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	A la espera de recibir el recurso por parte del Gobierno del Estado para iniciar proceso de adjudicación.						
										Inversores 50 KW/480 VCA	20	906,400.00												
										Adecuación de subestación eléctrica y equipos	7700	2,242,181.00												
										Alimentación subterránea	150	58,820.00												
										Estructura de soporte	900	2,539,287.00												
										Adecuaciones en azoteas y en terreno	1	2,296,073.00												
										Forjado de nichos para inversores	8	871,374.00												
										Instalación (mano de obra)	1	635,469.00												
										TOTAL	9380	13,269,604.00												
2	Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	X					\$ 7,123,341.00	\$ -	\$ 7,123,341.00	Aulas	0	0.00			0%	POR DEFINIR	POR DEFINIR	A la espera de recibir el recurso por parte del Gobierno del Estado para iniciar proceso de adjudicación.						
										Áreas comunes	0	0.00												
										Oficinas administrativas	0	0.00												
										Otros (áreas comunes)	3	3090.00												
										TOTAL	3	3,090.00												
							\$20,392,945.00	\$0.00	\$20,392,945.00															


Dr. José de Jesús Williams
Nombre y firma del Titular de la IES
Rector

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escoffié Aguilar
Director General de Finanzas y Administración
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

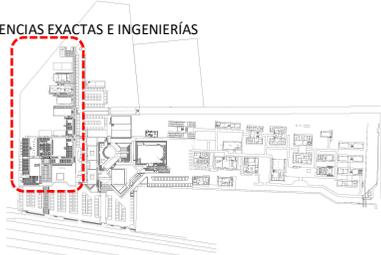 Porcentaje de avance <h1>0%</h1>	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Implementación de Sistema Fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería Química	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UADY CAMPUS DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Avenida Industrias No Contaminantes S/N por Periférico Norte Apartado Postal 150 Cordemex CP 97510
	Referencia de fotos en croquis			

FOTOS

	Comentarios de los trabajos realizados: Imágenes del estado actual de las azoteas y áreas a utilizar.
<p>F1: Vista general de las azoteas de la dependencia</p>	<p>F2:</p>

<p>F3:</p>	<p>F4:</p>	<p>F5:</p>
------------	------------	------------

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escoffé Aguilar
Director General de Finanzas y Administración
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD **2**


Nombre de la obra: **Terminación de la Facultad de Contaduría y Administración del campus de Ciencias Sociales**




Porcentaje de avance

0%

UADY
CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES

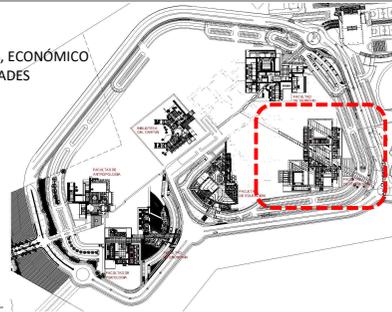

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

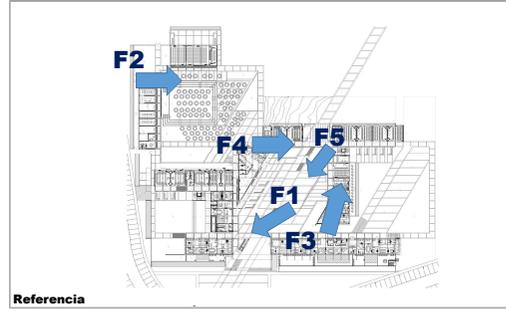

Referencia

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Km. 1 carretera Mérida-Tizimin CP 97305

FOTOS



F1: Pórtico de acceso principal




F2: Auditorio al aire libre y exteriores inconclusos

Comentarios de los trabajos realizados:
Imágenes del estado actual de las instalaciones



F3: Pintura interior de edificios C y D

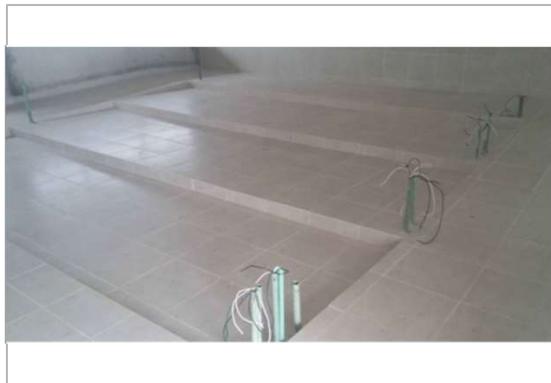

F4: Instalación de red de voz y datos inconclusa



F5: Vista general de la Facultad

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. José Antonio González Vadillo
Arq. José Antonio González Vadillo
Coordinador Administrativo de Proyectos y Construcción
Enlace por parte de la IES

M.I. Manuel de Jesús Escoffé Aguilar
Director General de Finanzas y Administración
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.**
